



現場情報共有ツール KOMIX

詳細取扱説明書

CHAP 1

起動・画面構成

CHAP 2

ピンの詳細設定

CHAP 3

集計・分析

CHAP 4

写真・描画エディタ

CHAP 5

変更履歴

CHAP 6

各種レポート出力

CHAP 7

竣工検査記録帳票

CHAP 8

設定・データ管理

起動・画面構成

起動画面の操作説明。

起動画面の選択肢



前回のファイルを続ける

最終保存日時・ファイル名表示
不一致の場合 ⚠ 警告が出ます

ファイルを開く

保存済みJSONを選択
メンバーからのファイルも開けます

新しくはじめる

現場名を入力して新規作成
図面は後からでも設定可能

起動・画面構成

メイン画面の各部説明。


メイン画面の構成



図面タブ

図面表示・ピン配置・移動

〇〇株式会社△△工場 排水処理場改修工事

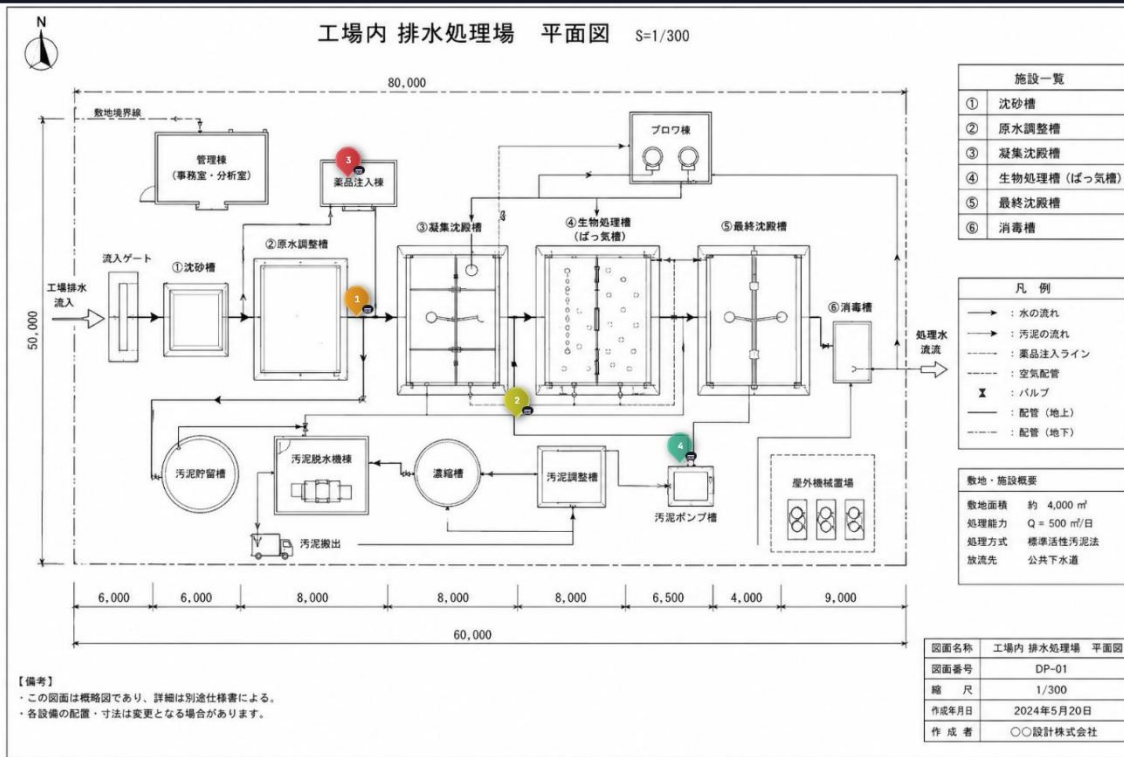

? ヘルプ

一覧 集計 履歴 設定

検索... 未完了

#01 施工 確認 未完了
配管にバルブを入れること。
原水調整槽 ■ 2025-06-10
システム太郎 = 1枚

#02 施工 未完了
既設濃縮槽を撤去し、更新する。
濃縮槽 ■ 2025-06-10
システム太郎 = 1枚

#03 設計 改善 未完了
分岐配管を取り出す。
薬品注入機付点 ■ 2025-06-12
システム花子 = 1枚

#04 施工 完了
サポートが不足している。
汚泥ポンプ機付点 ■ 2025-06-15
システム太郎 = 1枚



一覧タブ

ピン一覧・検索・絞り込み



集計タブ

統計グラフ・各種出力ボタン



履歴タブ

変更履歴の確認・個別削除



設定タブ

図面・データ管理・起動画面へ戻る

ピンの詳細設定

各入力フィールドの意味と操作方法。

ピン追加

×

区分

優先度

施工

設計

中

写真 (ドラッグ&ドロップ または Ctrl+V でペースト可)

写真追加

手書きメモ

指摘項目

日付

確認

2026/06/10

記入者

エステム太郎

対象

バルブ追加

場所

原水調整槽

指摘内容

配管にバルブを入れること。

対処方法

工場休業日に施工を実施。

完了予定日

2026/06/19

完了済み

保存

区分★

施工 / 設計 竣工検査記録帳票の出力が変わります

優先度★

高 ● (赤) 中 ● (橙) 低 ● (黄)

指摘項目★

確認/改善/残工事/対策/改善案/検討 から選択

写真

写真追加 / Ctrl+V / ドラッグ&ドロップ
描画エディタで注釈追加可能

記入者

担当者名

対象

対象箇所・機器名を入力

場所

場所・エリア名を入力

指摘内容

具体的な指摘内容を自由記述

対処方法

対処・対策内容を記入

完了予定日

カレンダーから選択


完了済みトグル

ONにするとピンが緑になり完了扱いになります

ピンの操作

ピンの移動・編集・削除・一覧での操作方法。

〇〇株式会社△△工場 排水処理場改造工事

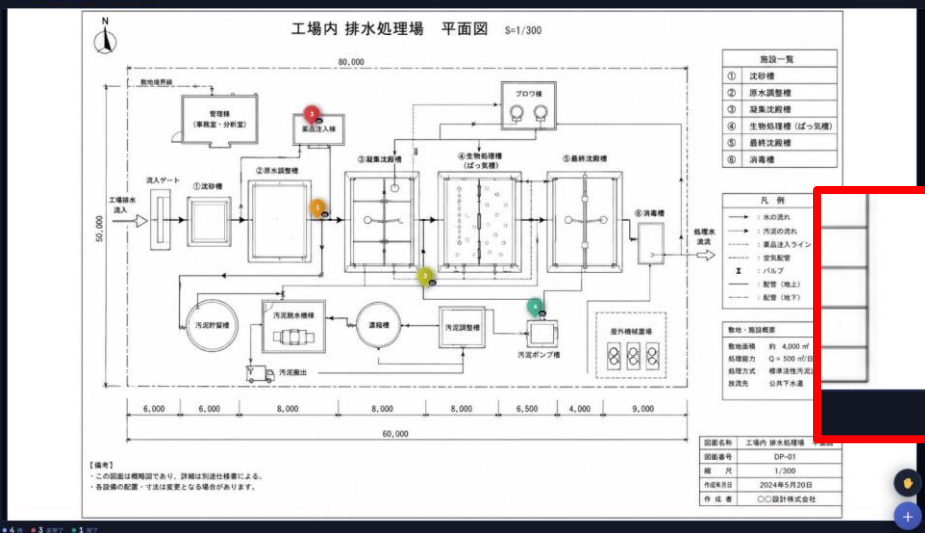

ピンの配置



+ボタンで追加モードON
図面をクリック/タップで配置

ピンの移動



👉 ボタンをOFFにした状態で
ピンを長押し→ドラッグ

ピンの編集



ピンまたは一覧カードをタップ
編集フォームが開きます

検索・絞り込み



一覧タブの検索ボックス
「未完了」ボタンで絞り込み

ピンの削除



編集フォーム内の
削除ボタンで削除

完了チェック



完了トグルON→緑ピン
一覧から除外できます



一覧



集計



履歴



設定

検索...

未完了



#01 施工 確認 未完了

配管にバルブを入れること。

📍 原水調整槽 📅 2026-06-10

👤 エステム太郎 📄 1枚



#02 施工 未完了

既設濃縮槽を撤去し、更新する。

📍 濃縮槽 📅 2026-06-10

👤 エステム太郎 📄 1枚

集計・分析

ピンデータを自動集計・グラフ化します。

一覧 集計 履歴 設定

集計

4

総件数

3

未完了

1

完了

指摘項目別

確認 1

改善 1

優先度別

中 1

低 1

高 2

区分別

施工 3

設計 1

出力



ピンレポート（全件）

全ピンの詳細・写真付きHTML



ピン選択レポート

出力するピンを選んでHTML出力



ピン配置図面

図面上にピン番号を配置して出力



竣工検査記録帳票の作成

設計・施工ピンをExcel様式で出力



CSV出力

全ピン情報を表計算形式で保存

サマリー



総件数・未完了・完了数をリアルタイム表示

指摘項目別



確認/改善/残工事/対策/改善案/検討の件数

優先度別



高・中・低の件数グラフ

区分別



施工・設計の件数比率



出力ボタン群



集計タブ下部に各種出力ボタンがあります
→ CHAP6・7で詳しく説明

写真・描画エディタ

2レイヤー構造で自由に注釈を追加できます。

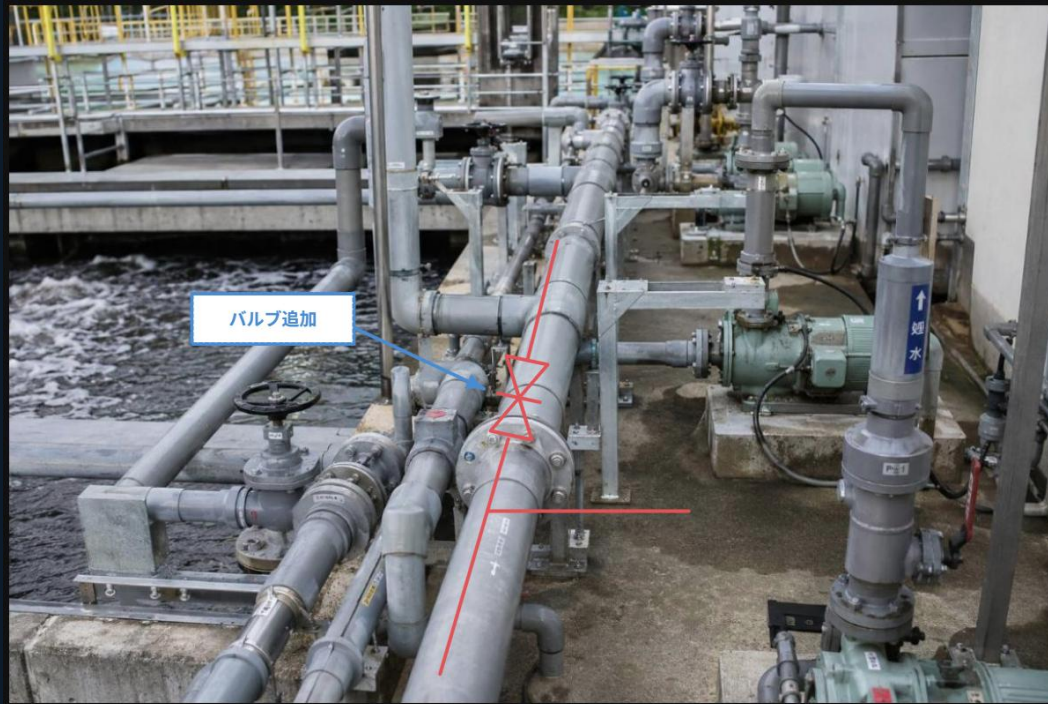

ツールバー構成 (2行)

1行目：色・太さ

黒・赤・黄・青・緑・白+太さスライダー

2行目：ツール

[消しゴム] フリーハンド/消
[□○/→X T] 図形/[手] 選択モード

図形ツールの操作



配置

ドラッグでサイズ決定 → 自動で🌀モードへ



選択・移動

内側ドラッグで移動



リサイズ

コーナーハンドルをドラッグ



回転

上部ハンドルをドラッグ



削除

右上の赤Xをクリック



テキスト編集

ダブルクリックでテキスト再編集

変更履歴

ピンの変更を自動記録。履歴からピンに直接移動できます。

一覧

集計

履歴

設定

🕒 変更履歴

クリア

2026/06/30 15:16 ・ エステム花子

✕

✏️ 更新 #02 設計 改善 📌
分岐配管を取り出す。

写真

2026/06/30 15:15 ・ エステム太郎

✕

🗑️ 削除 #01 施工 確認
配管にバルブを入れること。

2026/06/30 15:12 ・ エステム太郎

✕

✏️ 更新 #04 施工 📌
サポートが不足している。

完了状態

2026/06/30 15:12 ・ エステム太郎

✕

➕ 追加 #04 施工 📌
サポートが不足している。

2026/06/30 15:11 ・ エステム花子

✕

➕ 追加 #03 設計 改善 📌
分岐配管を取り出す。

2026/06/30 15:10 ・ エステム太郎

✕

➕ 追加 #02 施工 📌
既設濃縮槽を撤去し、更新する。

2026/06/30 15:08 ・ エステム太郎

✕

➕ 追加 #01 施工 確認 📌
配管にバルブを入れること。

記録される操作



追加

ピン新規追加



更新

フィールド変更（変更箇所をタグ表示）



削除

ピン削除（移動不可）



写真変更

写真追加・削除・描画変更

履歴カードの操作



ピンに移動

カードをタップ → 図面上のピンに移動してフォームが開く



個別削除

カード右上の✕で1件だけ削除



全件クリア

履歴タブ右上の「クリア」ボタンで全削除

各種レポート出力

集計タブ下部の出力ボタンから各種レポートを生成できます。

現場共有レポート
〇〇株式会社△△工場 排水処理場改造工事
出力日: 2026/6/30
出力件数: 4件 / 表示: 3件

#01 **竣工** **完了**

日付	2026-06-10
対象	バルブ追加
場所	排水調整槽
実施内容	配管にバルブを入れること。
対応方法	工場休業日に施工を実施。
完了予定日	2026-06-10
記入者	エース太郎



#02 **竣工** **完了**

現場共有レポート（全件）



全ピンの詳細＋写真をHTMLで出力。
ブラウザの印刷機能でPDF化できます。

ピン選択レポート



出力するピンをチェックで選択してHTML出力。
「すべて選択/解除」ボタンあり。

ピン配置図面




図面にピン番号を重ねてHTML出力。
優先度色：高●中●低●完了●

csv出力



全ピン情報をCSV形式で保存。
Excelで開いて活用できます。

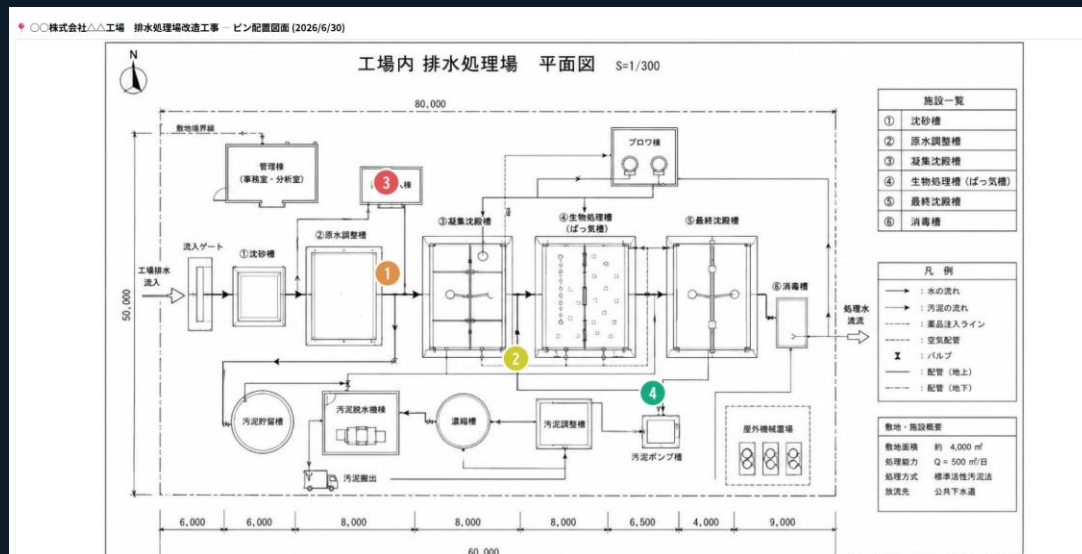

竣工検査記録帳票（Excel出力）

設計・施工のピン情報をExcelの所定フォームに自動転記します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	作成部門	設計工事課	竣工検査記録簿 <設計編>								
3	実施日						立会者		検査責任者*	検査者*2	
4	管理コード						お客様	お客様	営業担当	設計責任者	担当者
5	工事名称	〇〇株式会社△△工場 排水処理場改造工事									
6											
7	対象	指摘項目*3	場所	指摘内容				対処方法		完了予定日	
8	薬品配管の改造	改善	薬品注入庫付近	分岐配管を取り出す。							
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35	*3指摘項目	改善	今回の工事で改造等の対策を講ずる必要があるもの				*1:検査責任者:設計開発力量評価 設計責任者				
36		改善案	今回の工事で改造等の施工を行わずに、次回の設計に反映させる				*2:検査者:設計開発力量評価 設計担当者、×				
37		検討	施設の運転を開始してから不具合が発生すると予測されるもの								
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

出力手順



集計タブ → 出力 → 「竣工検査記録帳票の作成」
初回はPyodideのロードに20～60秒かかります

シート構成（3シート）



- ① 竣工検査記録簿（設計編）...区分=設計のピン
- ② 竣工検査記録簿（施工編）...区分=施工のピン
- ③ 竣工検査結果票

転記される項目



対象 / 指摘項目 / 場所 / 指摘内容 / 対処方法 / 完了予定日
現場名・ヘッダー番号も自動入力

注意事項



1シートあたり最大7件
Excel開後に担当者名・日付等を手入力

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	作成部門	設計工事課	竣工検査記録簿 <施工編>								
3	実施日						立会者		検査責任者*	検査者*2	
4	管理コード						お客様	お客様	営業担当	設計責任者	担当者
5	工事名称	〇〇株式会社△△工場 排水処理場改造工事									
6											
7	対象	指摘項目*3	場所	指摘内容				対処方法		完了予定日	
8	バルブ追加	確認	排水調整槽	配管にバルブを入れること。				工場休業日に施工を実施。		2026-06-18	
9											
10											
11											
12	濃縮槽の更新		濃縮槽	既設濃縮槽を撤去し、更新する。							
13											
14											
15											
16	汚泥配管		汚泥ポンプ槽付近	サポートが不足している。				サポートを追加する。		2026-06-11	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36	指摘項目	改善：今回の工事で施工上の対策を講ずる必要があるもの						*1: 検査責任者: 設計開発力量評価 設計責任者			
37		確認：不具合が予測されるので、その対象箇所を点検する						*2: 検査者: 設計開発力量評価 設計担当者、×			
38		殊工事：検査時点で施工が完了していないもの									
39		対策：不具合が予測されるので、何らかの対策を講じる必要があるもの									
40		改善案：今回の工事で改法等の施工を行わずに、次の施工に反映させる									
41											
42	<	①竣工検査記録簿(設計編)	②竣工検査記録簿(施工編)	竣工検査結果票	+						

設定・データ管理

設定タブ（PC版右ペイン）からすべての管理操作ができます。

一覧

集計

履歴

設定

現場

現場名を変更

 ○○株式会社△△工場 排水処理場改造工事

図面管理

図面をアップロード

 PNG・JPG・PDF・HEIC対応

図面を削除



データ管理

使用データ量

 2.0MB 使用中

ファイルを開く



データ保存



ピンをすべて削除



起動画面へ戻る



現場名の変更



現在の現場名を変更できます

図面の変更・削除



図面管理 → アップロードまたは削除

データ保存



現在のピン・履歴をJSONファイルで保存
現場名＋日付.json

ファイルを開く



保存済みJSONを読み込み
メンバーのファイルを開く

ピンをすべて削除



全ピンを一括削除（元に戻せません）
削除前に必ずデータ保存を

起動画面へ戻る



別の現場に切り替える場合はここから

よくある質問・トラブルシューティング

Q 前回のファイルが続けるで古いデータが開いた

A

起動画面に ⚠ 警告が出ていたら「ファイルを開く」から最新ファイルを選択してください。

Q 図面のピンが移動できない

A

👉 ボタンが青くなっていますか？ なっていない場合はボタンをONにしてください。

Q 竣工検査記録帳票の生成に時間がかかる

A

初回はPyodideのロードに20～60秒かかります。2回目以降はキャッシュが使われて速くなります。

Q 保存したのに次回起動時にデータが消えた

A

「データ保存」でJSONファイルを保存後、次回は「ファイルを開く」から選択してください。

Q 写真の描画で図形を消したい

A

👉 選択モードで図形をクリック → 右上の赤×で削除できます。消しゴムはフリーハンドのみ有効です。

Q ファイルサイズが大きい

A

写真枚数が多い場合にサイズが増加します。不要な写真を削除するか、描画後に再保存すると軽量化されます。
